



## Lettre d'information du chantier d'insertion

Janvier 2012  
N° 61

# LA TOUR DU BOST

### Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine

Siège social : Maison Rabut  
Brancion  
71700 MARTAILLY-LES-  
BRANÇION

Siège administratif :  
10, Rue des Juifs  
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24  
tremplin.hp@free.fr  
<http://www.tremplinhp.com>  
<http://www.tourdubost.com>

TREMLIN  
Homme et Patrimoine

Tout d'abord, nous vous souhaitons une très bonne année à tous. Commençons par le début : le montage de l'échafaudage au 3ème étage qui nous permettra de piquer le 4ème étage pour ensuite jointoyer avec un enduit légèrement rosé.

*(Piquetage : prendre un marteau et un burin pour creuser les anciens enduits de 2 à 3 cm afin de voir apparaître les pierres.)*

Plusieurs d'entre-nous ont continué de piquer le couloir et la montée d'escalier du 2ème au 3ème étage pour enfin démarrer des enduits s'approchant le plus possible de ceux d'origine dont nous avons conservé les parties les mieux conservées.

Dans le précédent journal nous vous avons fait part de notre fierté concernant l'achèvement du second étage. Malheureusement, suite au passage de l'architecte, tous les joints des alcôves ont dû être refaits car ils ne convenaient pas à la technique employée à l'époque. Nous avons aussi dessiné le plan des échafaudages montés qui nous sera nécessaire afin de remonter l'échafaudage plus rapidement la prochaine fois.



Afin d'optimiser le travail que l'on doit effectuer, mieux gérer le travail d'équipe et nous organiser, une partie de l'équipe a procédé à la conception d'un planning et d'un outil de suivi qui devront nous permettre de:


- Fixer des objectifs clairs et définis.
  - Donner des priorités.
  - Définir les compétences.
- Distribuer des postes de travail.
- Définir le nombre de personnes par poste.
- Mesurer les écarts entre le planning prévisionnel et le réel.
  - Responsabiliser les membres de l'équipe.
  - Apprendre à gérer le stress dû au travail.
  - Gérer le matériel et les matériaux.



Une autre partie de l'équipe s'est occupée d'un travail très physique : l'aménagement des alentours du site. Ce travail consistait à monter un mur de pierres sèches afin de pouvoir y stocker en quantité toutes les pierres.



N'oublions pas de préciser que les deux premiers étages ont été équipés d'une rampe en acier forgé, installée par les soins de Gauthier qui est bien utile pour faciliter la montée.

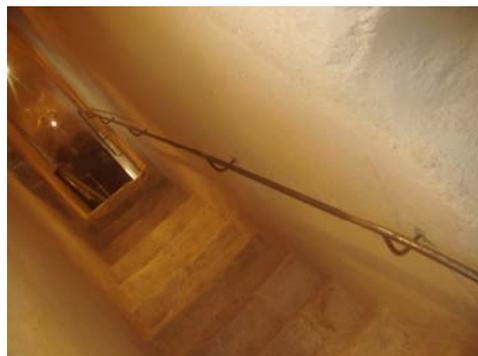

Nous souhaitons bonne chance à Hocine qui nous quitte en cette fin de mois.

Avec le concours de :

Conseil Général de Saône-et-Loire



DIRECCTE 71



Fonds Social Européen



Le PLIE CCM



La Communauté  
Creusot-Montceau



Direction Régionale des Affaires  
Culturelles de Bourgogne



Fédération Française du Bâtiment



Pôle Emploi

